

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εξέλιξη εργασιών επομένου δμήνου

29 Αυγούστου 2013



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ



ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ



Διαθεσιμότητα χώρων



Εκκρεμότητες στη κτίση χώρων:

Βενιζέλου & Αγ. Σοφία (νότιο τμήμα): Αρχαιολογία

Βούλγαρη & σήραγγα c&c (τμήμα ~300m) : Απαλλοτρίωση

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Επίσταθμος & Διασταύρωση

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Υφιστάμενη	Επομένου 6μήνου
Ολοκλήρωση εκσκαφών Ολοκλήρωση τμήματος cover & cut Ολοκλήρωση επιστάθμου	Ολοκλήρωση των έργων Πολιτικού Η/Μ



ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός & Διασταύρωση

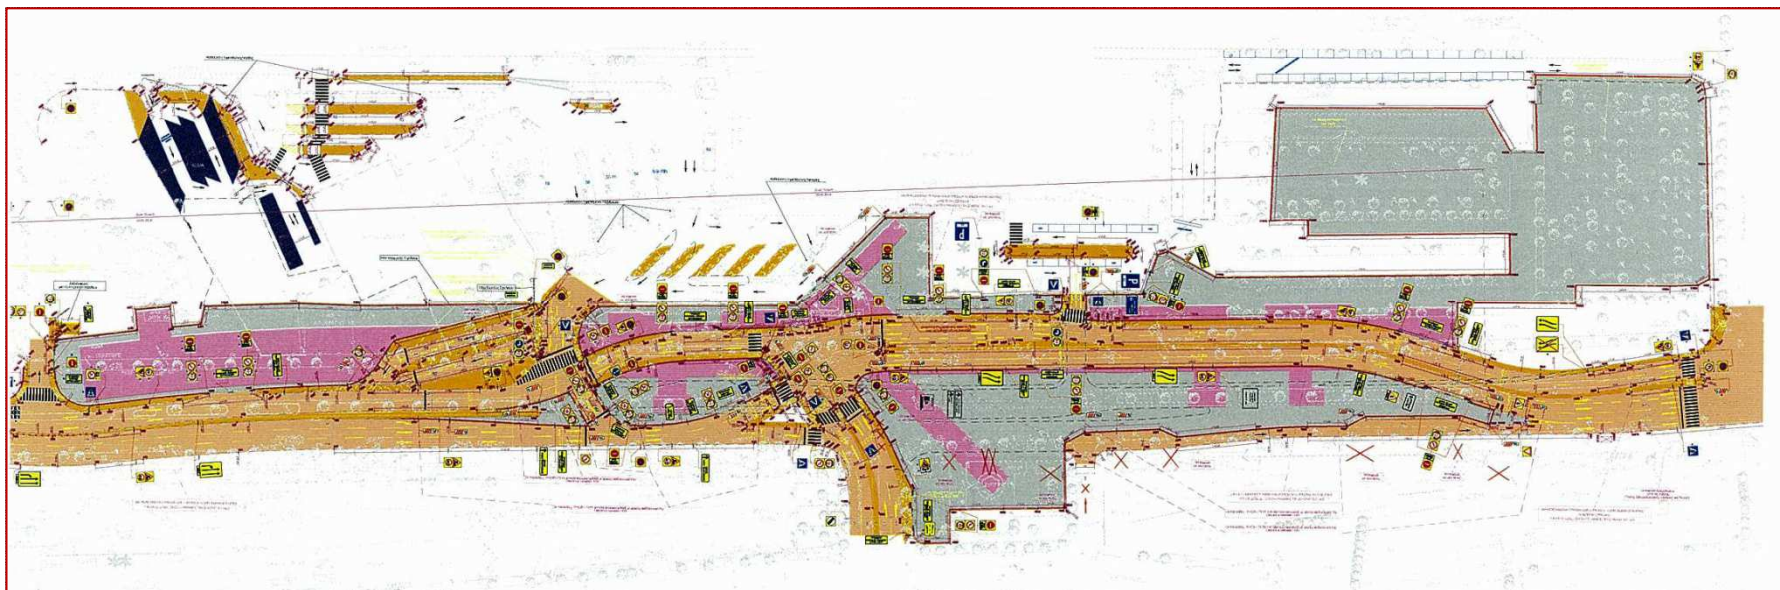

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Υφιστάμενη

Βόρεια πλευρά
οδ. Μοναστηρίου


Επόμενη (3/2014)

Νότια πλευρά
οδ. Μοναστηρίου

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Διακλάδωση Δημοκρατίας

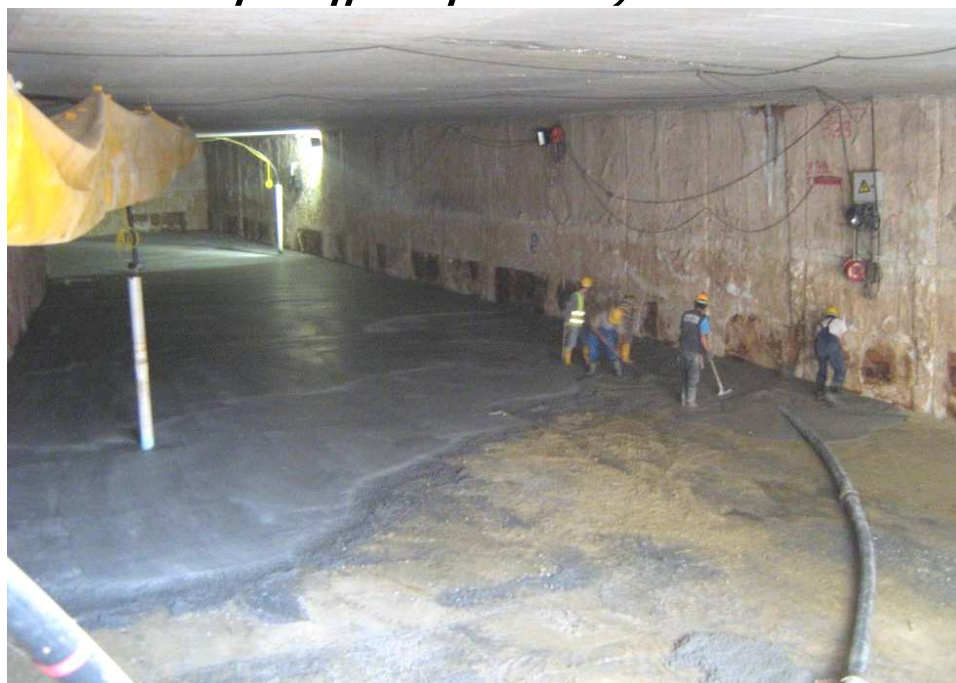

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Κατασκευή επιπέδου-1

Επομένου 6μήνου

Ολοκλήρωση των έργων
Πολιτικού Μηχανικού

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Δημοκρατίας

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Υφιστάμενη	Επομένου δμήνου
Εκσκαφή επιπέδου -1	Ολοκλήρωση πλάκας επιπέδου -1 Γεφύρωση & σκυροδέτηση πλάκας οροφής Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις



ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Δημοκρατίας

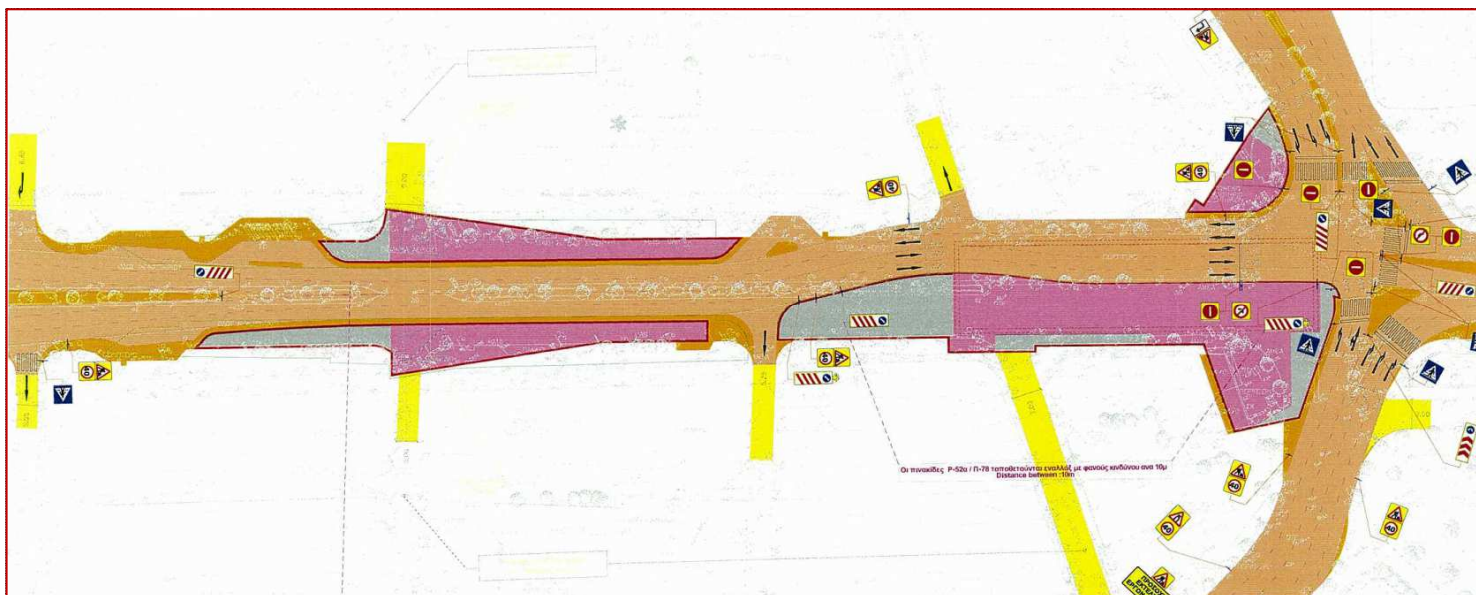

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Υφιστάμενη

Βόρειο τμήμα
Μοναστηρίου

Επόμενη (3/2014)

Νότιο τμήμα
Μοναστηρίου

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Βενιζέλου



ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Δεν εκτελούνται εργασίες

Επομένου 6μήνου

Συνέχιση της ανασκαφής

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Αγ. Σοφία

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Κατασκευή του επιπέδου -1
στο βόρειο τμήμα

Επομένου δμήνου

Αρχαιολογική έρευνα
στο νότιο τμήμα



ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Αγ. Σοφία



ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Υφιστάμενη

Βόρειο τμήμα της
οδ. Εγνατίας

Επόμενη (9/2013)

Νότιο τμήμα της
οδ. Εγνατίας

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Σιντριβάνι

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Κατασκευή επιπέδου -1

Επομένου 6μήνου

Κατασκευή επιπέδου -2
Κατασκευή μικροσηράγγων
κάτω από τη Βασιλική



ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Πανεπιστήμιο



ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Κατασκευή επιπέδου -3

Επομένου 6μήνου

Ολοκλήρωση των έργων Πολιτικού Μηχανικού
H/M

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Παπάφειο



ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Κατασκευή πασσάλων & διαφραγματικών τοίχων

Επομένου 6μήνου

Ολοκλήρωση πασσάλων & διαφραγματικών τοίχων
Εκσκαφή επιπέδων -1, -2 & -3

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Ευκλείδης


ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Ολοκλήρωση των έργων Πολιτικού Μηχανικού στα επίπεδα -1, -2 & -3
Κατασκευή επιπέδου -4
Η/Μ

Επομένου 6μήνου

Ολοκλήρωση των έργων Πολιτικού Μηχανικού στο σύνολο του σταθμού
Ολοκλήρωση των εσωτερικών τοίχων
Η/Μ

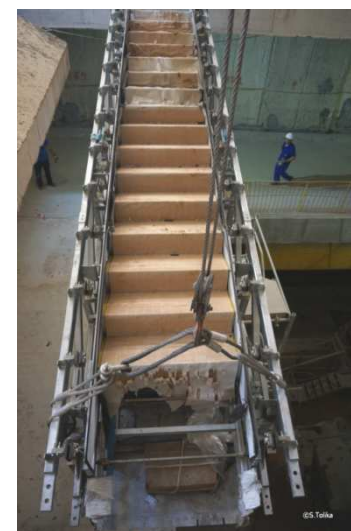

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Φλέμινγκ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Κατασκευή επιπέδων -1,-2 & -3

Επομένου δμήνου


Ολοκλήρωση των έργων Πολιτικού Μηχανικού
Η/Μ



ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Φλέμινγκ

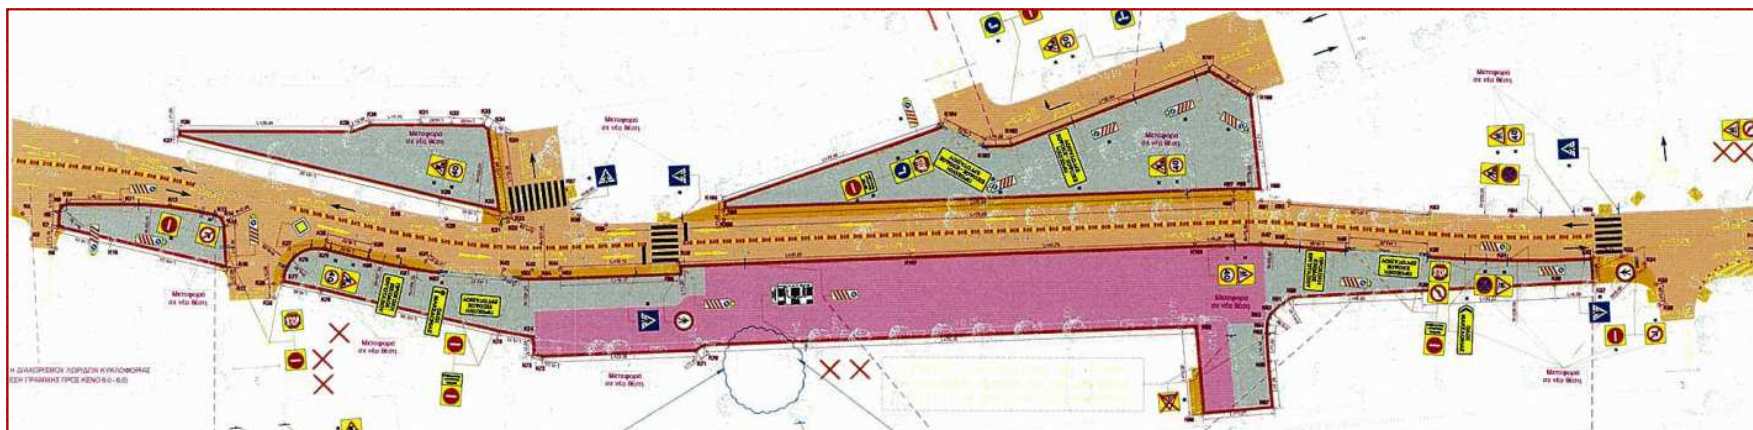

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Υφιστάμενη

Ανατολικό τμήμα της οδ. Δελφών


Επόμενη (3/2014)

Δυτικό τμήμα της οδ. Δελφών

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ανάληψη Σταθμός & Διασταύρωση

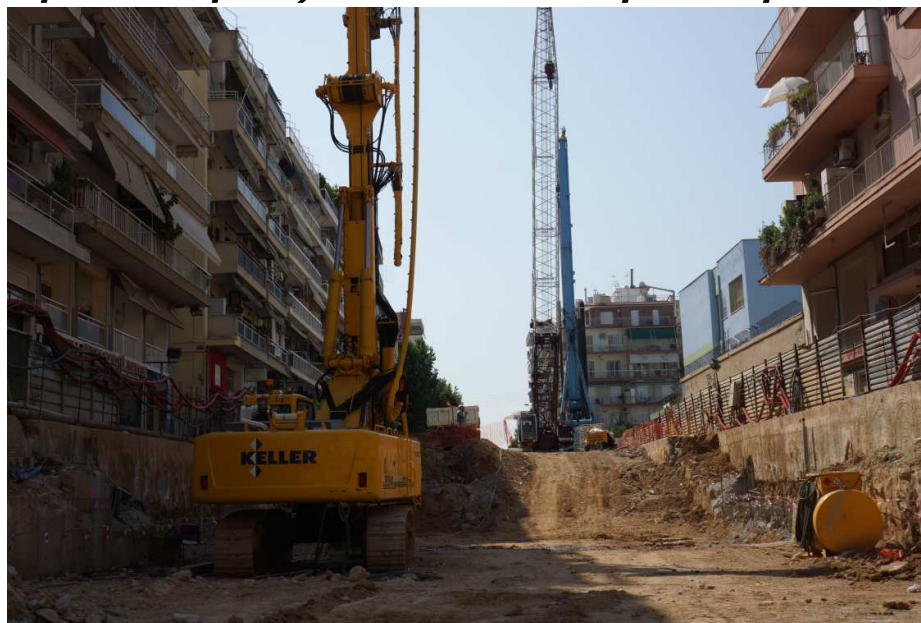

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Κατασκευή διαφραγματικών τοίχων & jet grouting


Επομένου 6μήνου

Ολοκλήρωση διαφραγματικών τοίχων & jet grouting
Κατασκευή πλάκας οροφής
Σε εξέλιξη η εκσκαφή

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ανάληψη Σταθμός & Διασταύρωση

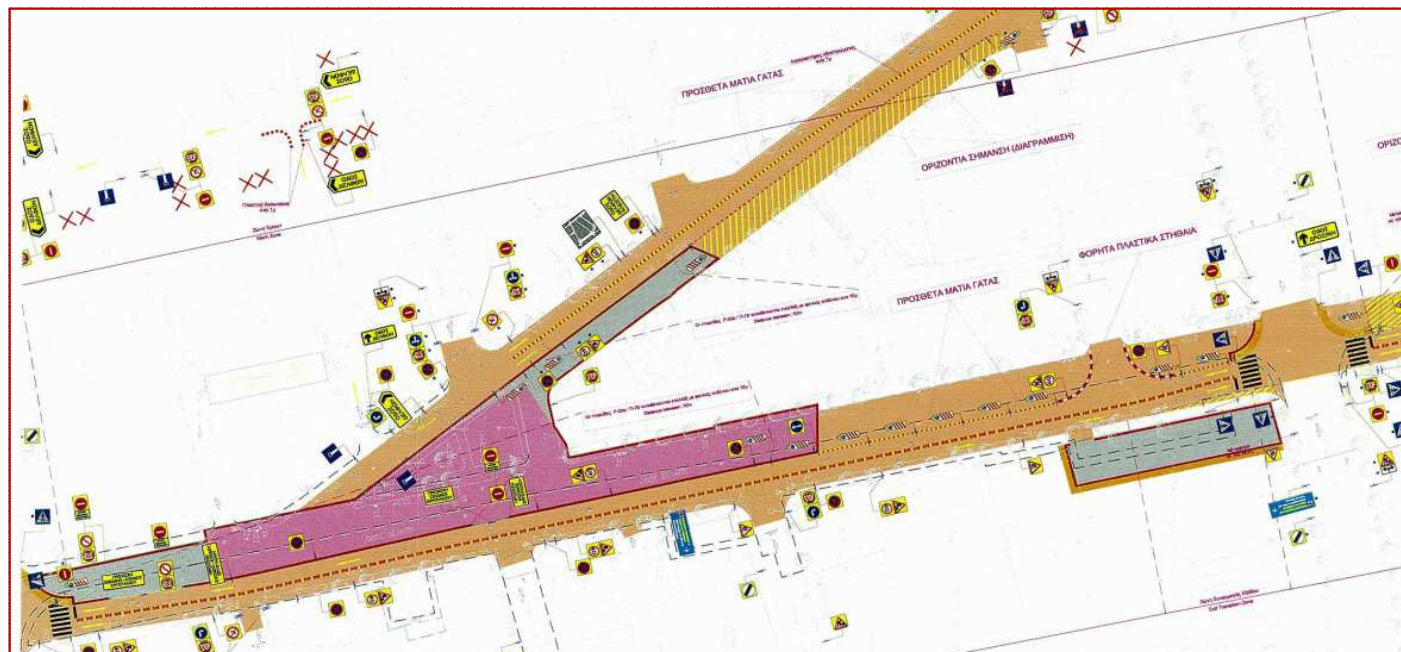

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Υφιστάμενη

Οδός Δελφών κλειστή

Επόμενη (12/2013)

Ανατολικό τμήμα οδ. Δελφών
(Μπότσαρη – Ψυχάρη)

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Πατρίκιος Σταθμός & Διακλάδωση

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Κατασκευή
διαφραγματικών
τοιχών & jet grouting
στη διακλάδωση

Επομένου 6μήνου

Κατασκευή διαφραγματικών
τοιχών & jet grouting
σταθμού & διακλάδωσης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις



ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Πατρίκιος Σταθμός & Διακλάδωση


ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Υφιστάμενη

Οδός Σόλωνος κλειστή
(από την οδ. Μαρτίου
έως την πλ. Πατρικίου)

Επόμενη (12/2013)

Αποκλεισμός οδ. Μαρτίου (από οδ. Σόλωνος προς Δελφών)
Εκτροπή κυκλοφορίας από την οδ. Μαρτίου στην οδ. Σνωκ
Αποκλεισμός της οδ. Σόλωνος (οδ. Χαλκιδικής-πλ. Πατρικίου)

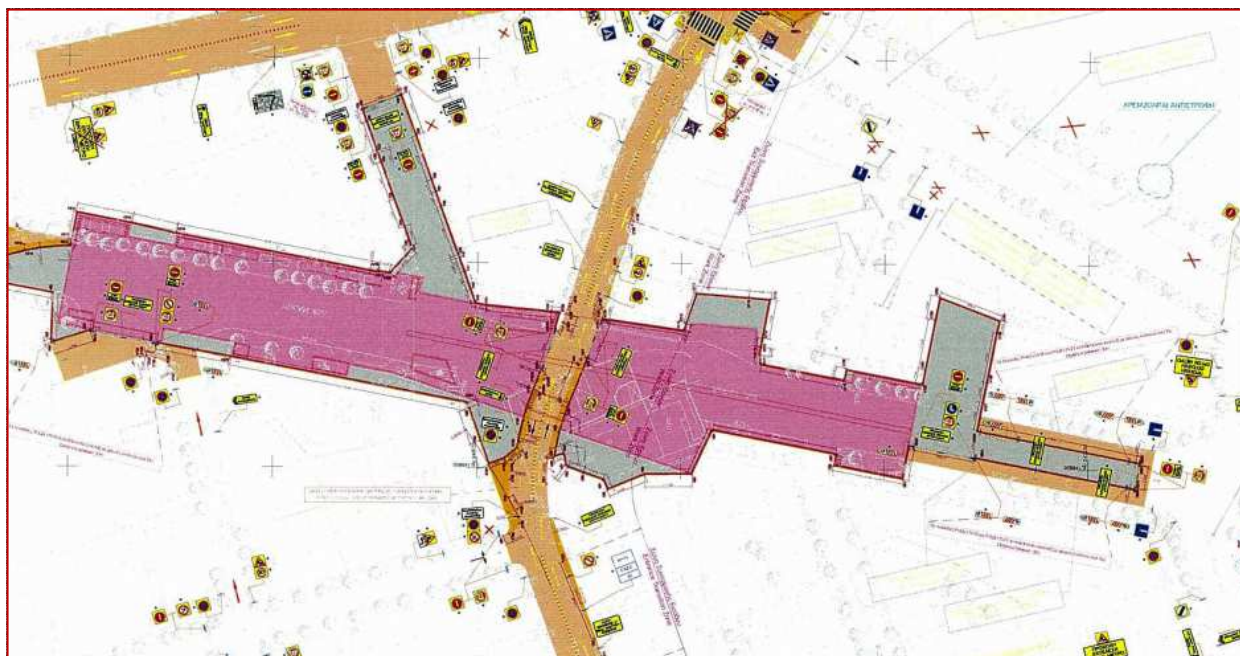



ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Βούλγαρη

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Καμία εργασία
(αναμονή ολοκλήρωσης της
διαδικασίας απαλλοτρίωσης)

Επομένου 6μήνου


Εκτροπή δικτύων ΟΚΩ
Κατασκευή διαφραγματικών τοίχων



ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθμός Βούλγαρη

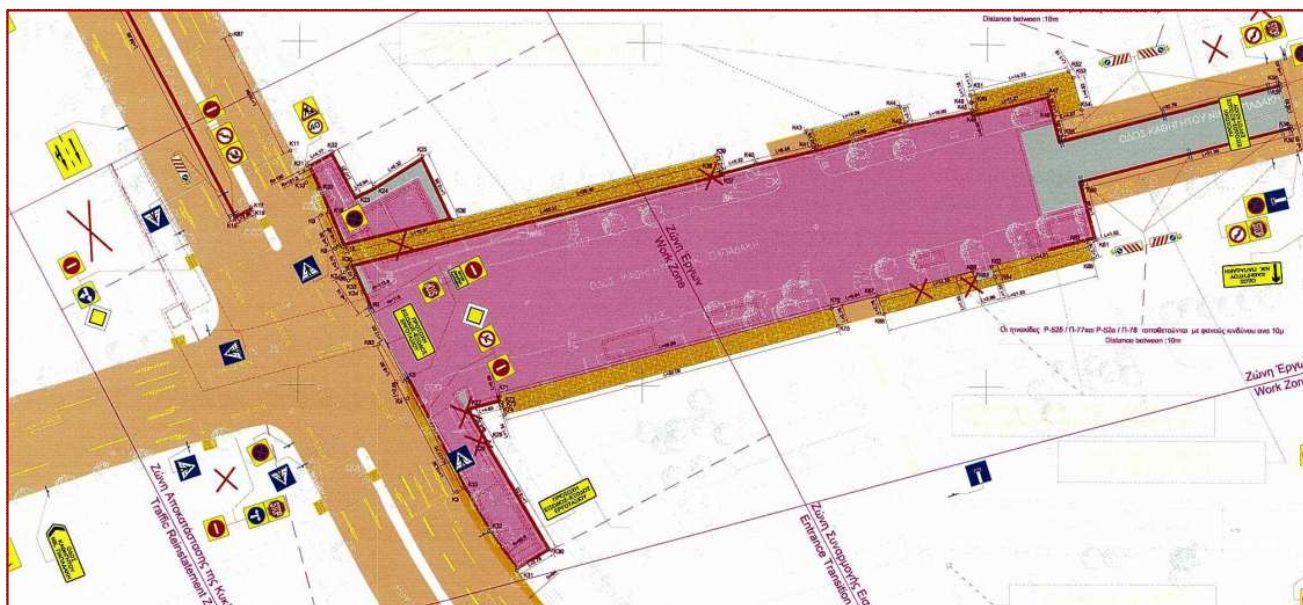

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Υφιστάμενη

Επόμενη (12/2013)

-

Αποκλεισμός της οδ. Παπαδάκη
μεταξύ των οδ. Βούλγαρη και Υψηλάντου

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ν. Ελβετία Σταθμός & Διασταύρωση

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Κατασκευή πασσάλων
αντιστήριξης

Επομένου δμήνου

Κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης και εκσκαφή
Ολοκλήρωση της εκσκαφής της Διασταύρωσης



ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αμαξοστάσιο

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υφιστάμενη

Γενικές εκσκαφές
Κατασκευή πασσάλων
Απομάκρυνση εγκαταστάσεων
υποστήριξης ΣΜΑ

Επομένου 6μήνου

Εκσκαφή
Κατασκευή πασσάλων
αντιστήριξης & θεμελίωσης
Θεμελίωση Κτιρίου Ι






ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σήραγγες

Ολοκληρώθηκαν ~12 km με TBM

c&c: Ξεκινάει η κατασκευή πασσάλων
& η εκσκαφή

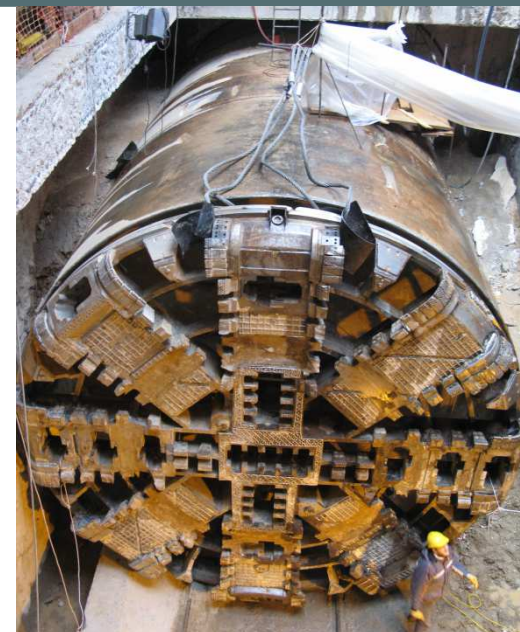

Εξέλιξη εργασιών το Μάρτιο 2014


1. Κατασκευασμένοι θα είναι τέσσερεις σταθμοί, ως προς τα έργα ΠΜ: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Πανεπιστήμιο, Ευκλείδης και Φλέμινγκ, ο επίσταθμος ΝΣΣ, η διακλάδωση Δημοκρατίας και δυο διασταυρώσεις
2. Τα μέτωπα εργασίας θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με εξαίρεση τους σταθμούς Βενιζέλου και Αγ. Σοφία, όπου θα συνεχίζεται η αρχαιολογική έρευνα
3. Θα έχει αντιμετωπιστεί το σύνολο των μελετητικών θεμάτων που αφορούν την κατασκευή

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου

Η ανάδοχος κ/ξία, δεδομένης της ενδυνάμωσης του σχήματος της, έχει τη δυνατότητα πλήρους ανάπτυξης των μετώπων εργασίας και είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εφόσον φυσικά δεν συνεχιστούν οι καθυστερήσεις στην κτίση των χώρων των σταθμών Βενιζέλου και Βούλγαρη

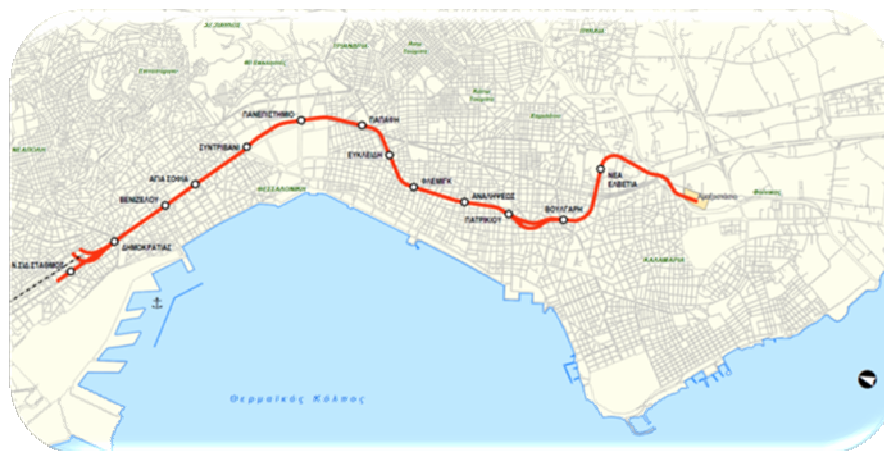

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

